Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		**Rahmenterminplan**	**339 Tage**	**Fre 27.06.25**	**Fre 30.10.26**	
32		**Bauzeitenplan**	**121 Tage**	**Fre 15.05.26**	**Fre 30.10.26**	
33		Pfingstferien BaWü 2026	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26	
34		Sommerferien BaWü 2026	33 Tage	Don 30.07.26	Sam 12.09.26	
35		Herbstferien BaWü 2026	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	
36		Rückbau Gastank	0 Tage	Mon 25.05.26	Mon 25.05.26	33AA;25AA
37		**Gewerk Außentüren, Fenster und Sonnenschutz (Bestand!)**	**86 Tage**	**Fre 15.05.26**	**Fre 11.09.26**	
38		Angebotsaufforderung	0 Tage	Fre 15.05.26	Fre 15.05.26	
39		Submission	0 Tage	Don 28.05.26	Don 28.05.26	38EA+10 Tage
40		Aufmaß, Werkstattzeichnung, Freigabe	10 Tage	Don 18.06.26	Mit 01.07.26	39EA+6 Tage;52EA+6
41		*Produktion*	42 Tage	Don 02.07.26	Fre 28.08.26	40
42		Aus-/Einbau Türen, Fenster inkl. Sonnenschutz	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	41
43		**Gewerk Rohbauarbeiten**	**55 Tage**	**Fre 24.07.26**	**Don 08.10.26**	
44		Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Dixi)	0 Tage	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	
45		Erd- und Aushubarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26	44EA+1 Tag
46		Sauberkeitsschicht Magerbeton, unter Fundamente	2 Tage	Don 30.07.26	Fre 31.07.26	45
47		Schal-, Bewehrungs-, Betonarbeiten	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	46
48		Rückbau Schalung, Verfüllen Arbeitsräume- und Baugrube	3 Tage	Mon 17.08.26	Mit 19.08.26	47
49		Rückbau Baustelleneinrichtung	0 Tage	Don 08.10.26	Don 08.10.26	64
50		**Containeranlage (Neustellung + Umbau/Sanierung Bestand)**	**105 Tage**	**Fre 15.05.26**	**Don 08.10.26**	
51		Öffentliche Ausschreibung	0 Tage	Fre 15.05.26	Fre 15.05.26	
52		Submission	0 Tage	Die 09.06.26	Die 09.06.26	51EA+18 Tage
53		Beauftragung	0 Tage	Die 23.06.26	Die 23.06.26	52EA+10 Tage
54		*Aufmaß, Werkstattzeichnung, Prüfstatik, Freigabe und Produktion Container*	45 Tage	Mit 24.06.26	Die 25.08.26	53
55		Neustellung Container	7 Tage	Mit 26.08.26	Don 03.09.26	54;48
56		Innenausbau Containeranlage neu und Sanierungsmaßnahmen Bestand	25 Tage	Fre 04.09.26	Don 08.10.26	55
57		Stellung Arbeitsgerüst	1 Tag	Fre 04.09.26	Fre 04.09.26	55
58		Bestandscontainer: Austausch Isopaneele	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	57
59		Container neu: Dacharbeiten inkl. Gründach	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	58
60		Rückbau Arbeitsgerüst	1 Tag	Mon 21.09.26	Mon 21.09.26	59
61		*Jahresfirma Stadt Sindelfingen: Hausanschlussarbeiten und Wärmepumpe*	25 Tage	Fre 04.09.26	Don 08.10.26	55
62		**Außenanlagen**	**25 Tage**	**Fre 04.09.26**	**Don 08.10.26**	
63		Wege, Plätze, Grünflächen, Sickergruben	25 Tage	Fre 04.09.26	Don 08.10.26	55
64		Bauende	0 Tage	Don 08.10.26	Don 08.10.26	63
65		Bauendreinigung und Umzug	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	

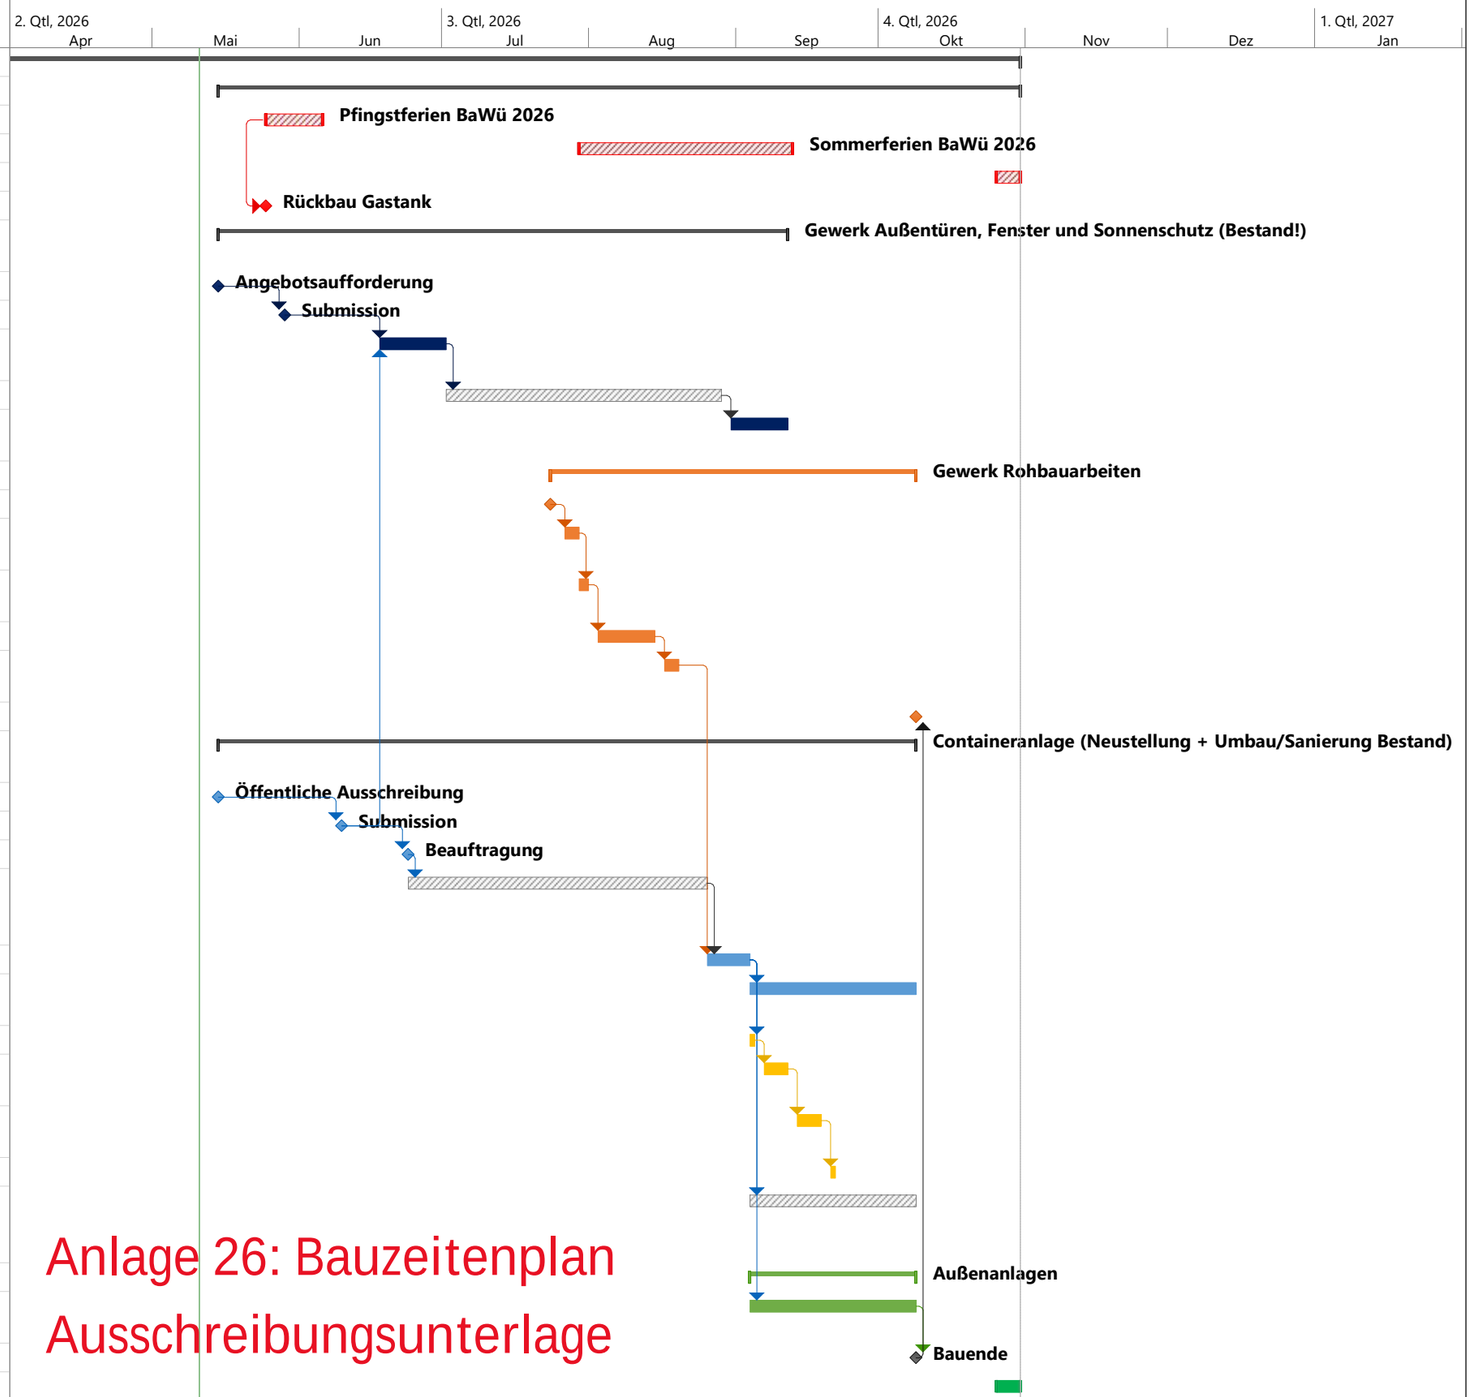

Anlage 26: Bauzeitenplan
Ausschreibungsunterlage

Bauzeiten- und Rahmenterminplan
Projekt: Übergangsbauwerk Grundschule Darmsheim
Stand: Mon 11.05.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag	
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit	
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein		

Grüne Felder: Termin zur Dokumentation
Rote Felder: Bewusste Änderungen/Ergänzungen (z.B. Bauverzögerung, Erhöhung Detailierungsgrad, Terminabsprache, etc.)
Blaue Felder: Keine genauen (Liefer-/Einbau-) Termine bekannt bzw. Vorgänger nicht final terminiert
