BAUABLAUFPLAN - V7

Nr.	Typ	Task Name	Zuständigkeit	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	HL	**Ausschreibung- und Vergabeterminplan BTB**		**510 d**	**16.04.2025**	**07.05.2027**		
239	HL	**ROHBAUARBEITEN UND GEBÄUDEHÜLLE**		**1336 d**	**19.04.2022**	**02.08.2027**		
240	HL	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**		**10 d**	**01.09.2025**	**12.09.2025**		**16AA**
242	HL	**ERD- UND ROHBAUARBEITEN**		**1165 d**	**19.04.2022**	**19.11.2026**		
243	HL	**Bereitstellungsplatzbaum Rohbauplanung**		**501 d**	**19.04.2022**	**26.11.2025**		
252	HL	**Erdarbeiten/ Platte Baugrube**		**240 d**	**03.02.2025**	**26.01.2026**		
260	HL	**Rohbauleistung**		**224 d**	**12.01.2026**	**19.11.2026**		
261	HL	**Fertigstellungstermine Rohbau**		**224 d**	**12.01.2026**	**19.11.2026**		**246AA-20 d**
262	HL	T1 Rohbauarbeiten		224 d	12.01.2026	19.11.2026	263	
263	HL	T1 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse A-I / 13-19 (Turm)		0 d	19.11.2026	19.11.2026	262	306EA+21 N;321;276
264	HL	T2 Rohbauarbeiten		145 d	12.01.2026	31.07.2026		265
265	HL	T2 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse G-I / 10-13 (Tiefbau)		0 d	31.07.2026	31.07.2026	264	266EA+21 N;320;275
266	HL	T3 Rohbauarbeiten		178 d	12.01.2026	14.09.2026	267	267
267	HL	T3 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse A-I / 7-10 (kurzer Riegel)		0 d	14.09.2026	14.09.2026	266	268EA+21 N;320;275
268	HL	T4 Rohbauarbeiten		137 d	12.01.2026	21.07.2026		269
269	HL	T4 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse G-I / 4-7 (Tiefbau)		0 d	21.07.2026	21.07.2026	268	270EA+21 N;319;274
270	HL	T5 Rohbauarbeiten		150 d	12.01.2026	07.08.2026		271
271	HL	T5 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse A-I / 1-4 (langer Riegel)		0 d	07.08.2026	07.08.2026	270	250EA+21 N;319;274
272	HL	**GEBÄUDEHÜLLE NEUBAU**		**257 d**	**22.07.2026**	**02.08.2027**		
273	HL	**Gerüstbauarbeiten**		**244 d**	**07.08.2026**	**02.08.2027**		**32AA**
274	HL	Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 1	Burkart Gerüstbau GmbH	0 d	07.08.2026	07.08.2026	269;271	
275	HL	Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 2	Burkart Gerüstbau GmbH	0 d	14.09.2026	14.09.2026	265;267	
276	HL	Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 3	Burkart Gerüstbau GmbH	0 d	19.11.2026	19.11.2026	263	
277	HL	Gerüstabbau		40 d	08.06.2027	02.08.2027	328;323;312SE;FIBEA+10 d	
278	HL	**Dachabdichtungsarbeiten**		**102 d**	**12.08.2026**	**10.05.2027**		**99AA**
279	HL	**Zwischengeschosse (Achse G-I / 4-7)**		**87 d**	**12.08.2026**	**10.12.2026**		
280	HL	Einbau Dachgullys Zwischengeschosse	AN Dachabdichtung	10 d	12.08.2026	25.08.2026	286EA+21 N	337;281
281	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	AN Dachabdichtung	10 d	26.08.2026	08.09.2026	280	329;282
282	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	AN Dachabdichtung	10 d	09.09.2026	22.09.2026	281	
283	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	AN Dachabdichtung	10 d	13.11.2026	26.11.2026	314EA+30 N;315EA+30	284
284	HL	Blitzschutzarbeiten / Montage Fluchtweg	AN Dachabdichtung	10 d	27.11.2026	10.12.2026	283	
285	HL	**Zwischengeschosse (G-I / 10-13)**		**79 d**	**24.08.2026**	**10.12.2026**		
286	HL	Einbau Dachgullys Zwischengeschosse	AN Dachabdichtung	10 d	24.08.2026	04.09.2026	290EA+21 N	337;287
287	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	AN Dachabdichtung	10 d	07.09.2026	18.09.2026	286	329;288
288	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	AN Dachabdichtung	10 d	21.09.2026	02.10.2026	287	
289	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	AN Dachabdichtung	10 d	13.11.2026	26.11.2026	314EA+30 N;315EA+30	290
290	HL	Blitzschutzarbeiten / Montage Fluchtweg	AN Dachabdichtung	10 d	27.11.2026	10.12.2026	289	
291	HL	**Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 1 (Achse A-I / 1-4)**		**79 d**	**31.08.2026**	**11.12.2026**		
292	HL	Einbau Dachgullys	AN Dachabdichtung	10 d	31.08.2026	11.09.2026	27?EA+21 N	293
293	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	AN Dachabdichtung	15 d	14.09.2026	02.10.2026	292	294;331
294	HL	Dachdurchführungen / Lichtkuppeln	AN Dachabdichtung	10 d	05.10.2026	16.10.2026	293	295
295	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	AN Dachabdichtung	20 d	19.10.2026	13.11.2026	294	296
296	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	AN Dachabdichtung	15 d	16.11.2026	04.12.2026	295;325	297
297	HL	Blitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage	Rückert-Möller GmbH	5 d	07.12.2026	11.12.2026	296	
298	HL	**Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 2 (Achse A-I / 7-10)**		**84 d**	**06.10.2026**	**16.02.2027**		
299	HL	Einbau Dachgullys	AN Dachabdichtung	10 d	06.10.2026	19.10.2026	26?EA+21 N	300
300	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	AN Dachabdichtung	15 d	20.10.2026	09.11.2026	299	301;332
301	HL	Dachdurchführungen / Lichtkuppeln	AN Dachabdichtung	10 d	10.11.2026	23.11.2026	300	302
302	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	AN Dachabdichtung	20 d	24.11.2026	21.12.2026	301	303
303	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	AN Dachabdichtung	15 d	25.01.2027	09.02.2027	302;326	304
304	HL	Blitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage	Rückert-Möller GmbH	5 d	10.02.2027	16.02.2027	303	
305	HL	**Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 3 (Achse A-I / 13-19)**		**95 d**	**11.12.2026**	**10.05.2027**		
306	HL	Einbau Dachgullys	AN Dachabdichtung	10 d	11.12.2026	11.01.2027	26?EA+21 N	307
307	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	AN Dachabdichtung	15 d	12.01.2027	01.02.2027	306	308;333
308	HL	Dachdurchführungen / Lichtkuppeln	AN Dachabdichtung	10 d	02.02.2027	15.02.2027	307	309
309	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	AN Dachabdichtung	20 d	16.02.2027	15.03.2027	308	310
310	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	AN Dachabdichtung	15 d	16.03.2027	05.04.2027	309;327	311
311	HL	Blitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage	Rückert-Möller GmbH	5 d	06.04.2027	12.04.2027	310	312EA+20 d
312	HL	Fertigstellung Dacharbeiten		0 d	10.05.2027	10.05.2027	311EA+20 d	277EA+20 d
313	HL	**PR Fassade**		**95 d**	**22.07.2026**	**01.12.2026**		
314	HL	PR Fassade Süd Achse G / 4-7	Trumpf GmbH	35 d	22.07.2026	06.09.2026	269	322;283EA+30 N;284EA+30 N;315
315	HL	PR Fassade Süd Achse G / 10-13	Trumpf GmbH	25 d	09.09.2026	13.10.2026	265;314	316;283EA+30 N;284EA+30 N
316	HL	PR Fassade Nord Achse I / 1-19	Trumpf GmbH	25 d	14.10.2026	17.11.2026	315	317
317	HL	Fertigstellung PR Fassade Hauptbestrung	Trumpf GmbH	10 d	18.11.2026	01.12.2026	316	
318	HL	**Fensterfassade**		**174 d**	**10.08.2026**	**26.04.2027**		**64AA;81AA**
319	HL	Fensterfassade Teil 1 | Achse A-I / 1-7	Reso GmbH	35 d	10.08.2026	25.09.2026	269;271	322;323EA-15 d;331;320
320	HL	Fensterfassade Teil 2 | Achse A-I / 7-13	Reso GmbH	35 d	28.09.2026	13.11.2026	265;267;319	322;324EA-15 d;332;321
321	HL	Fensterfassade Teil 3 | Achse A-I / 13-19	Reso GmbH	35 d	20.11.2026	25.01.2027	263;320	322;325EA-15 d;333
322	HL	Fensterbänke / Restarbeiten	AN Vorhangfassade	10 d	16.03.2027	29.03.2027	314;319;320;321	323EA+20 d
323	HL	Fertigstellung Fenstermontage Hauptbestrung	Reso GmbH	0 d	26.04.2027	26.04.2027	322EA+20 d	277
324	HL	**Vorhangfassade**		**144 d**	**01.09.2026**	**12.04.2027**		
325	HL	Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 1 | Achse A-I / 1-7	AN Vorhangfassade	50 d	07.09.2026	13.11.2026	319EA-15 d	296
326	HL	Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 2 | Achse A-I / 7-13	AN Vorhangfassade	50 d	26.10.2026	19.01.2027	320EA-15 d	115AA;303
327	HL	Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 3 | Achse A-I / 13-19	AN Vorhangfassade	50 d	18.12.2026	15.03.2027	321EA-15 d	328EA+20 d;333;310
328	HL	Fertigstellung Vorhangfassade	AN Vorhangfassade	0 d	12.04.2027	12.04.2027	327EA+20 d	277
329	HL	**AUSBAUARBEITEN**		**279 d**	**21.09.2026**	**01.11.2027**	**291;297**	
330	HL	**Hülle Dicht (horizontal + vertikal)**		**74 d**	**02.10.2026**	**01.02.2027**		
331	HL	Bau Dicht Teil 1 | Achse A-I / 1-7		0 d	02.10.2026	02.10.2026	293;310	334
332	HL	Bau Dicht Teil 2 | Achse A-I / 7-13		0 d	13.11.2026	13.11.2026	300;320	334
333	HL	Bau Dicht Teil 3 | Achse A-I / 13-19		0 d	01.02.2027	01.02.2027	307;321	334
334	HL	Baufreiheit für Innenausbau - Neubau		0 d	01.02.2027	01.02.2027	331;332;333	342
335	HL	**TGA Übergeodnet**		**140 d**	**21.09.2026**	**20.04.2027**		
336	HL	Technische Bearbeitung / Fertigung		140 d	21.09.2026	20.04.2027		
337	HL	Montage Regenfallrohre		10 d	21.09.2026	02.10.2026	280;286	338;339AA+5 d
338	HL	Fertigstellung Regenentwässerung		0 d	02.10.2026	02.10.2026	337	
339	HL	Montage Schächte und Steiger		20 d	28.09.2026	23.10.2026	337AA+5 d	340AA+10 d;341
340	HL	Einbringen Fertig-Badezimmerzellen		15 d	12.10.2026	30.10.2026	339AA+10 d	
341	HL	Zentralen		40 d	26.10.2026	18.12.2026	339	
342	HL	**Förderanlagen**		**21 d**	**01.02.2027**	**01.03.2027**	**334**	**354;358**
343	HL	Erstellung W+M-Planung		20 d	02.02.2027	01.03.2027	344AE	
344	HL	Prüfung und Freigabe W+M-Planung		15 d	02.02.2027	22.02.2027	345AE	343AE
345	HL	Lieferung Edelstahlteile an Rohbauer		5 d	02.02.2027	08.02.2027		344AE
346	HL	Rohmontage Aufzuganlage		10 d	02.02.2027	15.02.2027		
347	HL	Feintgemontage Aufzuganlage		10 d	02.02.2027	15.02.2027		
348	HL	Konformitätsbescheinigung Aufzug		0 d	01.02.2027	01.02.2027		
349	HL	**Treppenhäuser**		**114 d**	**16.11.2026**	**10.05.2027**		**101EA-30 d**
350	HL	**TH1**		**20 d**	**16.11.2026**	**11.12.2026**	**48AA**	
351	HL	Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen und Rohrahmenstützen	AN Schlosserarbeiten	10 d	16.11.2026	27.11.2026	352;355	
352	HL	Estrichentau Podeste	AN Estricharbeiten	5 d	30.11.2026	04.12.2026	351	353
353	HL	Fliesenarbeiten Podeste	AN Fliesenarbeiten	5 d	07.12.2026	11.12.2026	352	
354	HL	**TH2**		**20 d**	**03.03.2027**	**29.03.2027**	**342**	
355	HL	Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen und Rohrahmenstützen	AN Schlosserarbeiten	10 d	02.03.2027	15.03.2027	351	356;359
356	HL	Estrichentau Podeste	AN Estricharbeiten	5 d	16.03.2027	22.03.2027	355	357
357	HL	Fliesenarbeiten Podeste	AN Fliesenarbeiten	5 d	23.03.2027	29.03.2027	356	
358	HL	**TH3**		**40 d**	**16.03.2027**	**10.05.2027**	**342**	
359	HL	Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen und Rohrahmenstützen	AN Schlosserarbeiten	20 d	16.03.2027	12.04.2027	355	360
360	HL	Estrichentau Podeste	AN Estricharbeiten	10 d	13.04.2027	26.04.2027	359	361
361	HL	Fliesenarbeiten Podeste	AN Fliesenarbeiten	10 d	27.04.2027	10.05.2027	360	
362	HL	**Innenausbau Studentenzimmer / WCs**		**209 d**	**05.10.2026**	**01.11.2027**		
363	HL	**Ausbau TGA - BT I - EG - TB1**		**199 d**	**05.10.2026**	**26.07.2027**		
364	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	05.10.2026	16.10.2026		365;366;399;147AE-30 d
365	HL	Traswanmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	19.10.2026	30.10.2026	364	367;400
366	HL	Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Scilächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	19.10.2026	30.10.2026	364	367;401
367	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	02.11.2026	13.11.2026	365;366	368;402
368	HL	Rendiströmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	21.01.2027	27.01.2027	367	369;403;131AE-30 d
369	HL	Estrichentau	AN Estricharbeiten	5 d	28.01.2027	03.02.2027	368	370;404
370	HL	Estrich trocknen		5 d	04.02.2027	10.02.2027	369	371;405
371	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	11.02.2027	17.02.2027	370	372;373;406
372	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.02.2027	24.02.2027	371	374;407
373	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	18.02.2027	24.02.2027	371	374;375;408
374	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	372;373	376;409;177AE-30 d
375	HL	Schächte funwig schließen, Revisionsklappen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	373	376;410
376	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	04.03.2027	10.03.2027	374;375	377;411
377	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	376	378;412
378	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	377	379;413
379	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	378	380;414
380	HL	Boden spachtln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	379	381;415;193AE-30 d
381	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	380	382;416
382	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	381	383;417
383	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	382	384;418;223AE-30 d
384	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	03.05.2027	07.05.2027	383	385;419;209EA-30 d
385	HL	Einbaumöbel	AN Tischler Möbel	5 d	11.05.2027	17.05.2027	384	386;420
386	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	15.06.2027	17.06.2027	385	387;421;237EA-30 d
387	HL	Verfugen Randübergänge, Ward Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	18.06.2027	22.06.2027	386	388;389;422
388	HL	Schließanlage einbauen	SW	3 d	23.06.2027	25.06.2027	387	390;423
389	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage	AN Innentüren	3 d	23.06.2027	25.06.2027	387	390;424
390	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	28.06.2027	30.06.2027	388;389	391;425
391	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. inkl. Verfugen	AN HLS	3 d	01.07.2027	05.07.2027	390	392;426
392	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	06.07.2027	08.07.2027	391	393;427
393	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	09.07.2027	13.07.2027	392	394;428
394	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	14.07.2027	16.07.2027	393	395;396;429
395	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	19.07.2027	21.07.2027	394	397;430
396	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	19.07.2027	21.07.2027	394	397;431
397	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	22.07.2027	26.07.2027	395;396	432
398	HL	**Ausbau TGA - BT I - 1.OG - TB2**		**192 d**	**19.10.2026**	**29.07.2027**		
399	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	19.10.2026	30.10.2026	364	400;401;434
400	HL	Traswanmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	02.11.2026	13.11.2026	365;399	402;435
401	HL	Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Scilächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	02.11.2026	13.11.2026	366;399	402;436
402	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	16.11.2026	27.11.2026	367;400;401	403;437
403	HL	Rendiströmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	28.01.2027	03.02.2027	368;402	404;438
404	HL	Estrichentau	AN Estricharbeiten	5 d	04.02.2027	10.02.2027	369;403	405;439
405	HL	Estrich trocknen		5 d	11.02.2027	17.02.2027	370;404	406;440
406	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	18.02.2027	24.02.2027	371;405	407;408;441
407	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	372;406	409;442
408	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	373;406	409;410;443
409	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	374;407;408	411;444
410	HL	Schächte funwig schließen, Revisionsklappen einbauen, Q2 spachtelln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	375;408	411;445
411	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	11.03.2027	17.03.2027	376;409;410	412;446
412	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	377;411	413;447
413	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	378;412	414;448
414	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	379;413	415;449
415	HL	Boden spachtln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	380;414	416;450
416	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	381;415	417;451
417	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	382;416	418;452
418	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	383;417	419;453

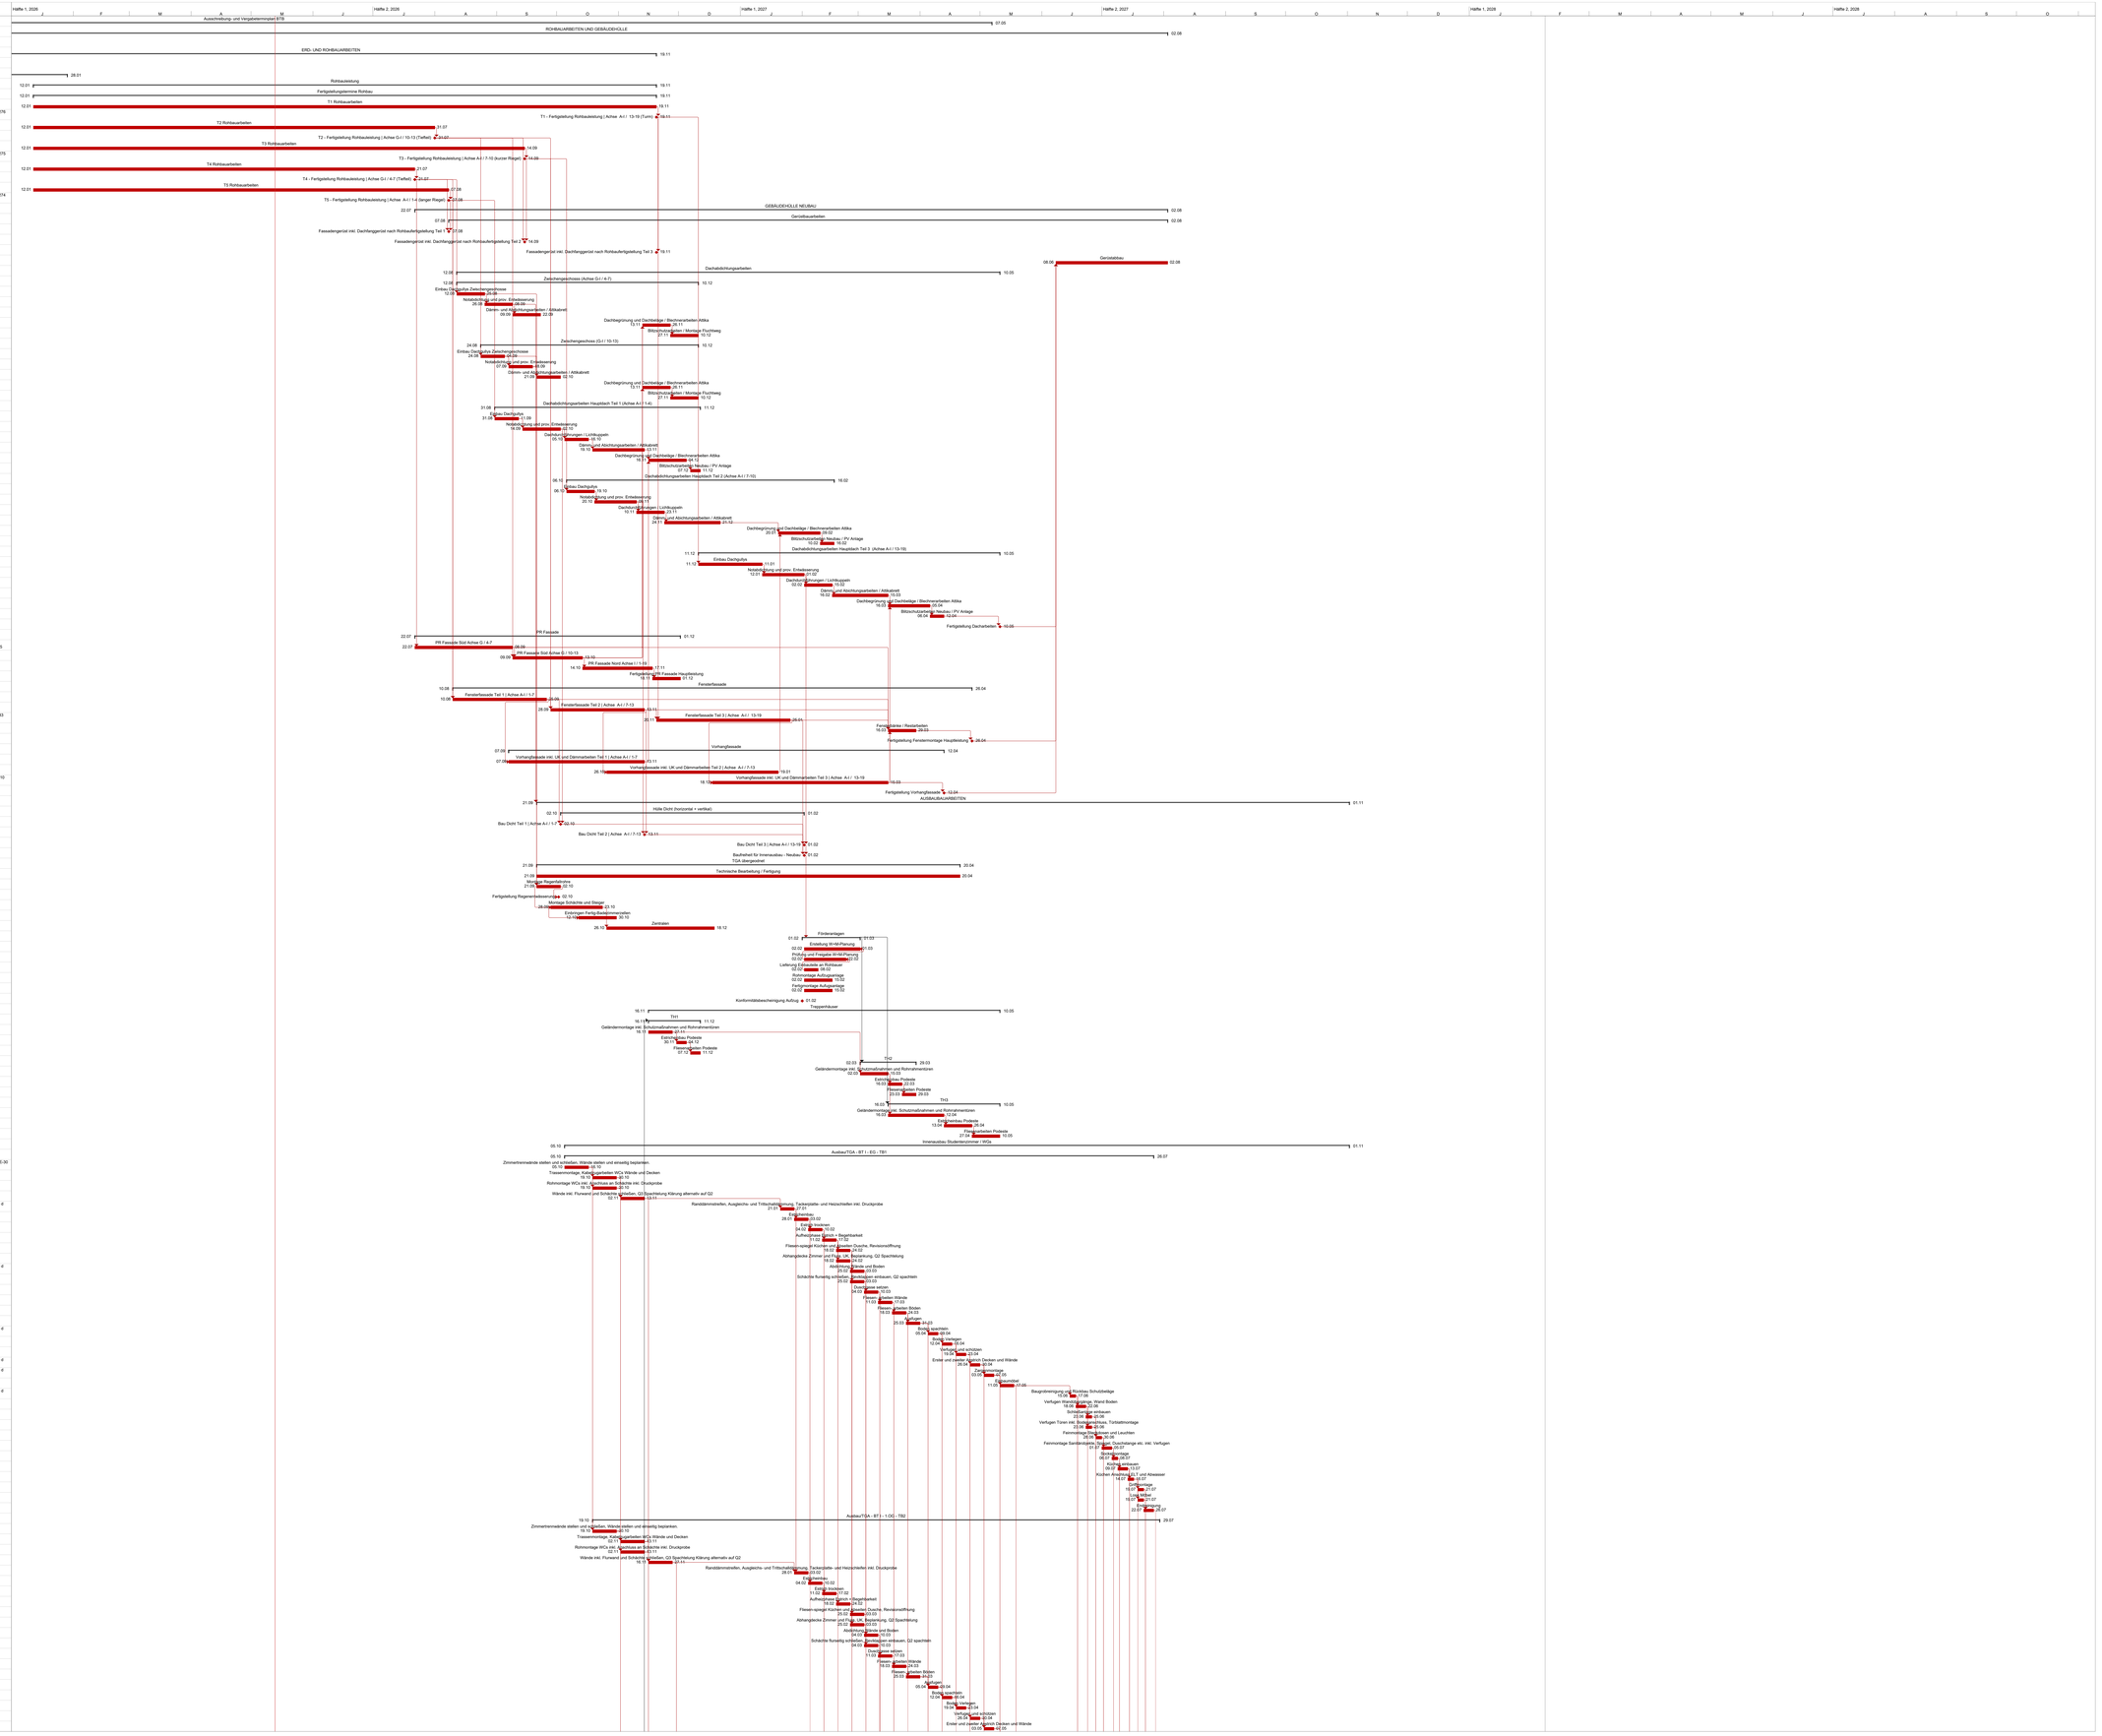

BAUABLAUFPLAN - V7

Nr.	Typ	Task Name	Zuständigkeit	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
419	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	11.05.2027	17.05.2027	384;418	420;454
420	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	19.05.2027	25.05.2027	385;419	421;455
421	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	18.06.2027	22.06.2027	386;420	422;456
422	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	23.06.2027	25.06.2027	387;421	423;424;457
423	HL	Schleifi- antage einbauen	SW	3 d	28.06.2027	30.06.2027	388;422	425;458
424	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	28.06.2027	30.06.2027	389;423	425;459
425	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	01.07.2027	05.07.2027	390;423;424	426;460
426	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschtränge etc.	AN HLS	3 d	06.07.2027	08.07.2027	391;425	427;461
427	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	09.07.2027	13.07.2027	392;426	428;462
428	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	14.07.2027	16.07.2027	393;427	429;463
429	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	19.07.2027	21.07.2027	394;428	430;431;464
430	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	22.07.2027	26.07.2027	395;429	432;465
431	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	22.07.2027	26.07.2027	396;429	432;466
432	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	27.07.2027	29.07.2027	397;430;431	467
433	HL	**Ausbau/TGA - BT I - 2.OG - TB3**		**185 d**	**02.11.2026**	**03.08.2027**		
434	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	02.11.2026	13.11.2026	399	435;436;469
435	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	16.11.2026	27.11.2026	400;434	437;470
436	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	16.11.2026	27.11.2026	401;434	437;471
437	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	30.11.2026	11.12.2026	402;435;436	438;472
438	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	04.02.2027	10.02.2027	403;437	439;473
439	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	11.02.2027	17.02.2027	404;438	440;474
440	HL	Estrich trocknen		5 d	18.02.2027	24.02.2027	405;439	441;475
441	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	25.02.2027	03.03.2027	406;440	442;443;476
442	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	407;441	444;477
443	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK; Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	408;441	444;445;478
444	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	409;442;443	446;479
445	HL	Schächte fluraelig schließen, Revisionsöffnungen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	410;443	446;480
446	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	18.03.2027	24.03.2027	411;444;445	447;481
447	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	412;446	448;482
448	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	413;447	449;483
449	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	414;448	450;484
450	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	415;449	451;485
451	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	416;450	452;486
452	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	417;451	453;487
453	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	418;452	454;488
454	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	19.05.2027	25.05.2027	419;453	455;489
455	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	26.05.2027	01.06.2027	420;454	456;490
456	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	23.06.2027	25.06.2027	421;455	457;491
457	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	28.06.2027	30.06.2027	422;456	458;459;492
458	HL	Schleifi- antage einbauen	SW	3 d	01.07.2027	05.07.2027	423;457	460;493
459	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	01.07.2027	05.07.2027	424;457	460;494
460	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	06.07.2027	08.07.2027	425;458;459	461;495
461	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschtränge etc.	AN HLS	3 d	09.07.2027	13.07.2027	426;460	462;496
462	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	14.07.2027	16.07.2027	427;461	463;497
463	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	19.07.2027	21.07.2027	428;462	464;498
464	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	22.07.2027	26.07.2027	429;463	465;466;499
465	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	27.07.2027	29.07.2027	430;464	467;500
466	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	27.07.2027	29.07.2027	431;464	467;501
467	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	30.07.2027	03.08.2027	432;465;466	502
468	HL	**Ausbau/TGA - BT I - 3.OG - TB4**		**170 d**	**16.11.2026**	**06.08.2027**	**355;KA**	
469	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	16.11.2026	27.11.2026	434	470;471;504
470	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	30.11.2026	11.12.2026	435;469	472;505
471	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	30.11.2026	11.12.2026	436;469	472;506
472	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	14.12.2026	12.01.2027	437;470;471	473;507
473	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	11.02.2027	17.02.2027	438;472	474;508
474	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	18.02.2027	24.02.2027	439;473	475;509
475	HL	Estrich trocknen		5 d	25.02.2027	03.03.2027	440;474	476;510
476	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	04.03.2027	10.03.2027	441;475	477;479;511
477	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	442;476	479;512
478	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK; Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	443;476	479;480;513
479	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	444;477;478	481;514
480	HL	Schächte fluraelig schließen, Revisionsöffnungen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	445;478	481;515
481	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	25.03.2027	31.03.2027	446;479;480	482;516
482	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	447;481	483;517
483	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	448;482	484;518
484	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	449;483	485;519
485	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	450;484	486;520
486	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	451;485	487;521
487	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	452;486	488;522
488	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	453;487	489;523
489	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	26.05.2027	01.06.2027	454;488	490;524
490	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	03.06.2027	09.06.2027	455;489	491;525
491	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	28.06.2027	30.06.2027	456;490	492;526
492	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	01.07.2027	05.07.2027	457;491	493;494;527
493	HL	Schleifi- antage einbauen	SW	3 d	06.07.2027	08.07.2027	458;492	495;528
494	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	06.07.2027	08.07.2027	459;492	495;529
495	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	09.07.2027	13.07.2027	460;493;494	496;530
496	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschtränge etc.	AN HLS	3 d	14.07.2027	16.07.2027	461;495	497;531
497	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	19.07.2027	21.07.2027	462;496	498;532
498	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	22.07.2027	26.07.2027	463;497	499;533
499	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	27.07.2027	29.07.2027	464;498	500;501;534
500	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	30.07.2027	03.08.2027	465;499	502;535
501	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	30.07.2027	03.08.2027	466;499	502;536
502	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	04.08.2027	06.08.2027	467;500;501	537
503	HL	**Ausbau/TGA - BT II/III - EG - TB5**		**171 d**	**30.11.2026**	**11.08.2027**		
504	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	30.11.2026	11.12.2026	469	505;506;539
505	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	14.12.2026	12.01.2027	470;504	507;540
506	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	14.12.2026	12.01.2027	471;504	507;541
507	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	13.01.2027	26.01.2027	472;505;506	508;542
508	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	16.02.2027	24.02.2027	473;507	509;543
509	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	474;508	510;544
510	HL	Estrich trocknen		5 d	04.03.2027	10.03.2027	475;509	511;545
511	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	11.03.2027	17.03.2027	476;510	512;513;546
512	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	477;511	514;547
513	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK; Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	478;511	514;515;548
514	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	479;512;513	516;549
515	HL	Schächte fluraelig schließen, Revisionsöffnungen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	480;513	516;550
516	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	05.04.2027	09.04.2027	481;514;515	517;551
517	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	482;516	518;552
518	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	483;517	519;553
519	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	484;518	520;554
520	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	485;519	521;555
521	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	486;520	522;556
522	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	487;521	523;557
523	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	488;522	524;558
524	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	03.06.2027	09.06.2027	489;523	525;559
525	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	10.06.2027	16.06.2027	490;524	526;560
526	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	01.07.2027	05.07.2027	491;525	527;561
527	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	06.07.2027	08.07.2027	492;526	528;529;562
528	HL	Schleifi- antage einbauen	SW	3 d	09.07.2027	13.07.2027	493;527	530;563
529	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	09.07.2027	13.07.2027	494;527	530;564
530	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	14.07.2027	16.07.2027	495;528;529	531;565
531	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschtränge etc.	AN HLS	3 d	19.07.2027	21.07.2027	496;530	532;566
532	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	22.07.2027	26.07.2027	497;531	533;567
533	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	27.07.2027	29.07.2027	498;532	534;568
534	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	30.07.2027	03.08.2027	499;533	535;536;569
535	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	04.08.2027	06.08.2027	500;534	537;570
536	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	04.08.2027	06.08.2027	501;534	537;571
537	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	09.08.2027	11.08.2027	502;535;536	572
538	HL	**Ausbau/TGA - BT II/III - 1.OG - TB6**		**184 d**	**14.12.2026**	**16.08.2027**		
539	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	14.12.2026	12.01.2027	504	540;541;574
540	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	13.01.2027	26.01.2027	505;539	542;575
541	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	13.01.2027	26.01.2027	506;539	542;576
542	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	27.01.2027	09.02.2027	507;540;541	543;577
543	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	25.02.2027	03.03.2027	508;542	544;578
544	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	509;543	545;579
545	HL	Estrich trocknen		5 d	11.03.2027	17.03.2027	510;544	546;580
546	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	18.03.2027	24.03.2027	511;545	547;548;581
547	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	512;546	549;582
548	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK; Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	513;546	549;550;583
549	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	514;547;548	551;584
550	HL	Schächte fluraelig schließen, Revisionsöffnungen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	515;548	551;585
551	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	12.04.2027	16.04.2027	516;549;550	552;586
552	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	517;551	553;587
553	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	518;552	554;588
554	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	519;553	555;589
555	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	520;554	556;590
556	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	521;555	557;591
557	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	522;556	558;592
558	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	03.06.2027	09.06.2027	523;557	559;593
559	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	10.06.2027	16.06.2027	524;558	560;594
560	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	17.06.2027	23.06.2027	525;559	561;595
561	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	08.07.2027	09.07.2027	526;560	562;596
562	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	09.07.2027	13.07.2027	527;561	563;564;597
563	HL	Schleifi- antage einbauen	SW	3 d	14.07.2027	16.07.2027	528;562	565;598
564	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	14.07.2027	16.07.2027	529;562	565;599
565	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	19.07.2027	21.07.2027	530;563;564	566;600
566	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschtränge etc.	AN HLS	3 d	22.07.2027	26.07.2027	531;565	567;601
567	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	27.07.2027	29.07.2027	532;566	568;602
568	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	30.07.2027	03.08.2027	533;567	569;603
569	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	04.08.2027	06.08.2027	534;568	570;571;604
570	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	09.08.2027	11.08.2027	535;569	572;605
571	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	09.08.2027	11.08.2027	536;569	572;606
572	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	12.08.2027	16.08.2027	537;570;571	607
573	HL	**Ausbau/TGA - BT II/III - 2.OG - TB7**		**157 d**	**13.01.2027**	**19.08.2027**		
574	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	13.01.2027	26.01.2027	539	575;576;609
575	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	27.01.2027	09.02.2027	540;574	577;610
576	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	27.01.2027	09.02.2027	541;574	577;611
577	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	10.02.2027	23.02.2027	542;575;576	578;612
578	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	04.03.2027	10.03.2027	543;577	579;613
579	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	544;578	580;614
580	HL	Estrich trocknen		5 d	18.03.2027	24.03.2027	545;579	581;615
581	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	25.03.2027	31.03.2027	546;580	582;583;616
582	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	547;581	584;617
583	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK; Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	548;581	584;585;618

BAUABLAUFPLAN - V7

Nr.	Typ	Task Name	Zuständigkeit	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
584	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	549;562;583	586;619
585	HL	Schächte flurseitig schließen, Revisklappen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	550;583	586;620
586	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	19.04.2027	23.04.2027	551;584;585	587;621
587	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	552;586	588;622
588	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	553;587	589;623
589	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	554;588	590;624
590	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	555;589	591;625
591	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	556;590	592;626
592	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	03.06.2027	09.06.2027	557;591	593;627
593	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	10.06.2027	16.06.2027	558;592	594;628
594	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	17.06.2027	23.06.2027	559;593	595;629
595	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	24.06.2027	30.06.2027	560;594	596;630
596	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	08.07.2027	13.07.2027	561;595	597;631
597	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	14.07.2027	16.07.2027	562;596	598;599;632
598	HL	Schleiß- anlage einbauen	SW	3 d	19.07.2027	21.07.2027	563;597	600;633
599	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türtüstimontage	AN Innentüren	3 d	19.07.2027	21.07.2027	564;597	600;634
600	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	22.07.2027	26.07.2027	565;598;599	601;635
601	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	AN HLS	3 d	27.07.2027	29.07.2027	566;600	602;636
602	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagarbeiten	3 d	30.07.2027	03.08.2027	567;601	603;637
603	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	04.08.2027	06.08.2027	568;602	604;638
604	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	09.08.2027	11.08.2027	569;603	605;606;639
605	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	12.08.2027	16.08.2027	570;604	607;640
606	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	12.08.2027	16.08.2027	571;604	607;641
607	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	17.08.2027	19.08.2027	572;605;606	642
608	HL	**Ausbau/TGA - BT III/II - 3.OG - TBB**		**150 d**	**27.01.2027**	**24.08.2027**		
609	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	27.01.2027	09.02.2027	574	610;611;644
610	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	10.02.2027	23.02.2027	575;609	612;645
611	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	10.02.2027	23.02.2027	576;609	612;646
612	HL	Wände inkl. Flurward und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	24.02.2027	09.03.2027	577;610;611	613;647
613	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	11.03.2027	17.03.2027	578;612	614;648
614	HL	Estrichverlegung	AN Estricharbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	579;613	615;649
615	HL	Estrich trocknen		5 d	25.03.2027	31.03.2027	580;614	616;650
616	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	05.04.2027	09.04.2027	581;615	617;618;651
617	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abwesser Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	582;616	619;652
618	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	583;616	619;620;653
619	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	584;617;618	621;654
620	HL	Schächte flurseitig schließen, Revisklappen einbauen, Q2 spachtelt	AN Trockenbauarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	585;618	621;655
621	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	26.04.2027	30.04.2027	586;619;620	622;656
622	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	587;621	623;657
623	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	588;622	624;658
624	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	589;623	625;659
625	HL	Boden spachtelt	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	590;624	626;660
626	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	03.06.2027	09.06.2027	591;625	627;661
627	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	10.06.2027	16.06.2027	592;626	628;662
628	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	17.06.2027	23.06.2027	593;627	629;663
629	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	24.06.2027	30.06.2027	594;628	630;664
630	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	01.07.2027	07.07.2027	595;629	631;665
631	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	14.07.2027	16.07.2027	596;630	632;666
632	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	19.07.2027	21.07.2027	597;631	633;634;667
633	HL	Schleiß- anlage einbauen	SW	3 d	22.07.2027	26.07.2027	598;632	635;668
634	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türtüstimontage	AN Innentüren	3 d	22.07.2027	26.07.2027	599;632	635;669
635	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	27.07.2027	29.07.2027	600;633;634	636;670
636	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	AN HLS	3 d	30.07.2027	03.08.2027	601;635	637;671
637	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagarbeiten	3 d	04.08.2027	06.08.2027	602;636	638;672
638	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	09.08.2027	11.08.2027	603;637	639;673
639	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	12.08.2027	16.08.2027	604;638	640;641;674
640	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	17.08.2027	19.08.2027	605;639	642;675
641	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	17.08.2027	19.08.2027	606;639	642;675
642	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	20.08.2027	24.08.2027	607;640;641	677
643	HL	**Ausbau/TGA - BT III - 4.+5.OG - TBB**		**143 d**	**10.02.2027**	**27.08.2027**		
644	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	10.02.2027	23.02.2027	609	645;646;679
645	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	24.02.2027	09.03.2027	610;644	647;680
646	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	24.02.2027	09.03.2027	611;644	647;681
647	HL	Wände inkl. Flurward und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	10.03.2027	23.03.2027	612;645;646	648;682
648	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	24.03.2027	30.03.2027	613;647	649;683
649	HL	Estrichverlegung	AN Estricharbeiten	5 d	31.03.2027	06.04.2027	614;648	650;684
650	HL	Estrich trocknen		5 d	07.04.2027	13.04.2027	615;649	651;685
651	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	14.04.2027	20.04.2027	616;650	652;653;686
652	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abwesser Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	21.04.2027	27.04.2027	617;651	654;687
653	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	21.04.2027	27.04.2027	618;651	654;652;688
654	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	28.04.2027	04.05.2027	619;652;653	656;689
655	HL	Schächte flurseitig schließen, Revisklappen einbauen, Q2 spachtelt	AN Trockenbauarbeiten	5 d	28.04.2027	04.05.2027	620;653	656;690
656	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	05.05.2027	11.05.2027	621;654;655	657;691
657	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.05.2027	18.05.2027	622;656	658;692
658	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	623;657	659;693
659	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	624;658	660;694
660	HL	Boden spachtelt	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	03.06.2027	09.06.2027	625;659	661;695
661	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	10.06.2027	16.06.2027	626;660	662;696
662	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	17.06.2027	23.06.2027	627;661	663;697
663	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	24.06.2027	30.06.2027	628;662	664;698
664	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	01.07.2027	07.07.2027	629;663	665;699
665	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	08.07.2027	14.07.2027	630;664	666;700
666	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	19.07.2027	21.07.2027	631;665	667;701
667	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	22.07.2027	26.07.2027	632;666	668;669;702
668	HL	Schleiß- anlage einbauen	SW	3 d	27.07.2027	29.07.2027	633;667	670;703
669	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türtüstimontage	AN Innentüren	3 d	27.07.2027	29.07.2027	634;667	670;704
670	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	30.07.2027	03.08.2027	635;668;669	671;705
671	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	AN HLS	3 d	04.08.2027	06.08.2027	636;670	672;706
672	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagarbeiten	3 d	09.08.2027	11.08.2027	637;671	673;707
673	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	12.08.2027	16.08.2027	638;672	674;708
674	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	17.08.2027	19.08.2027	639;673	675;676;709
675	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	20.08.2027	24.08.2027	640;674	677;710
676	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	20.08.2027	24.08.2027	641;674	677;711
677	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	25.08.2027	27.08.2027	642;675;676	712
678	HL	**Ausbau/TGA - BT II - 6.OG - TB10**		**140 d**	**24.02.2027**	**07.09.2027**		
679	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	24.02.2027	09.03.2027	644	680;681
680	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	Rückert-Möller GmbH	10 d	10.03.2027	23.03.2027	645;679	682
681	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	AN HLS	10 d	10.03.2027	23.03.2027	646;679	682
682	HL	Wände inkl. Flurward und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	24.03.2027	06.04.2027	647;680;681	683
683	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	AN HLS	5 d	07.04.2027	13.04.2027	648;682	684
684	HL	Estrichverlegung	AN Estricharbeiten	5 d	14.04.2027	20.04.2027	649;683	685
685	HL	Estrich trocknen		5 d	21.04.2027	27.04.2027	650;684	686
686	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	AN HLS	5 d	28.04.2027	04.05.2027	651;685	687;688
687	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abwesser Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.05.2027	11.05.2027	652;686	689
688	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	05.05.2027	11.05.2027	653;686	689;690
689	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.05.2027	18.05.2027	654;687;688	691
690	HL	Schächte flurseitig schließen, Revisklappen einbauen, Q2 spachtelt	AN Trockenbauarbeiten	5 d	12.05.2027	18.05.2027	655;688	691
691	HL	Duschtasse setzen	AN HLS	5 d	19.05.2027	25.05.2027	656;689;690	692
692	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	657;691	693
693	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	02.06.2027	08.06.2027	658;692	694
694	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	09.06.2027	15.06.2027	659;693	695
695	HL	Boden spachtelt	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	16.06.2027	22.06.2027	660;694	696
696	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	23.06.2027	29.06.2027	661;695	697
697	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	30.06.2027	06.07.2027	662;696	698
698	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	07.07.2027	13.07.2027	663;697	699
699	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	14.07.2027	20.07.2027	664;698	700
700	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	21.07.2027	27.07.2027	665;699	701
701	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	28.07.2027	30.07.2027	666;700	702
702	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	02.08.2027	04.08.2027	667;701	703;704
703	HL	Schleiß- anlage einbauen	SW	3 d	05.08.2027	09.08.2027	668;702	705
704	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türtüstimontage	AN Innentüren	3 d	05.08.2027	09.08.2027	669;702	705
705	HL	Feinmontage Steckdosen und Leuchten	Rückert-Möller GmbH	3 d	10.08.2027	12.08.2027	670;703;704	706
706	HL	Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	AN HLS	3 d	13.08.2027	17.08.2027	671;705	707
707	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagarbeiten	3 d	18.08.2027	20.08.2027	672;706	708
708	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	23.08.2027	25.08.2027	673;707	709
709	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwesser	AN Tischler Küchen	3 d	26.08.2027	30.08.2027	674;708	710;711
710	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	31.08.2027	02.09.2027	675;709	712
711	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	31.08.2027	02.09.2027	676;709	712
712	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	03.09.2027	07.09.2027	677;710;711	713
713	HL	**Abnahmen/ Mängelbeseitigung**		**39 d**	**08.09.2027**	**01.11.2027**	**712**	
714	HL	Abnahmen		15 d	08.09.2027	21.09.2027		715
715	HL	Restarbeiten / Mangelbeseitigung		29 d	22.09.2027	01.11.2027	714	
716	HL	**AUSSENANLAGEN**		**100 d**	**19.07.2027**	**03.12.2027**		
722	HL	**ÜBERGABEN PROJEKTNACHLAUF**		**110 d**	**16.08.2027**	**07.02.2028**		
